1 Coursework initiation and project sele
开始时间: 2026年9月7日 标识号: 1
完成时间: 2026年9月9日 工期: : 3 个工作日
完成: 100%

1.1 Read the assignment brief and fix the deliverable sc
开始日期: 2026年9月7日 标识号: 2
完成时间: 2026年9月7日 工期: 1 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite

2 Requirements engineering
开始时间: 2026年9月9日 标识号: 6
完成时间: 2026年10月2 工期: : 31 个工作日
完成: 81%

3 System design and architecture
开始时间: 2026年9月16 标识号: 12
完成时间: 2026年9月22 工期: : 5 个工作日
完成: 100%

4 Backend platform and data layer
开始时间: 2026年9月16 标识号: 17
完成时间: 2026年10月2 工期: : 28 个工作日
完成: 83%

5 Map and place data integration
开始时间: 2026年9月16 标识号: 24
完成时间: 2026年9月28 工期: : 9 个工作日
完成: 69%

6 AI agent and Hermes capability
开始时间：2026年9月16 标识号： 30
完成时间：2026年10月7 工期： ：16 个工作日
完成：82%

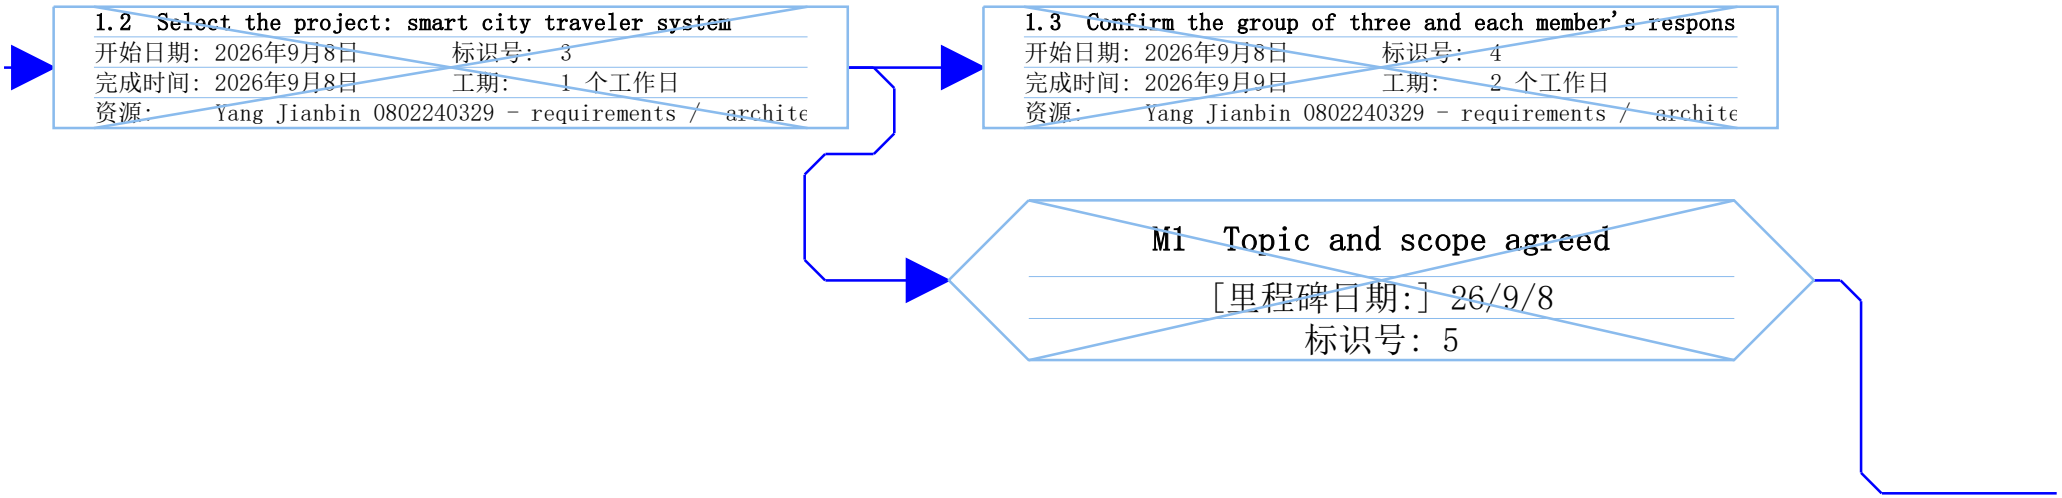
7 Frontend UI and interaction
开始时间：2026年9月16 标识号： 37
完成时间：2026年10月1 工期： ：12 个工作日
完成：100%

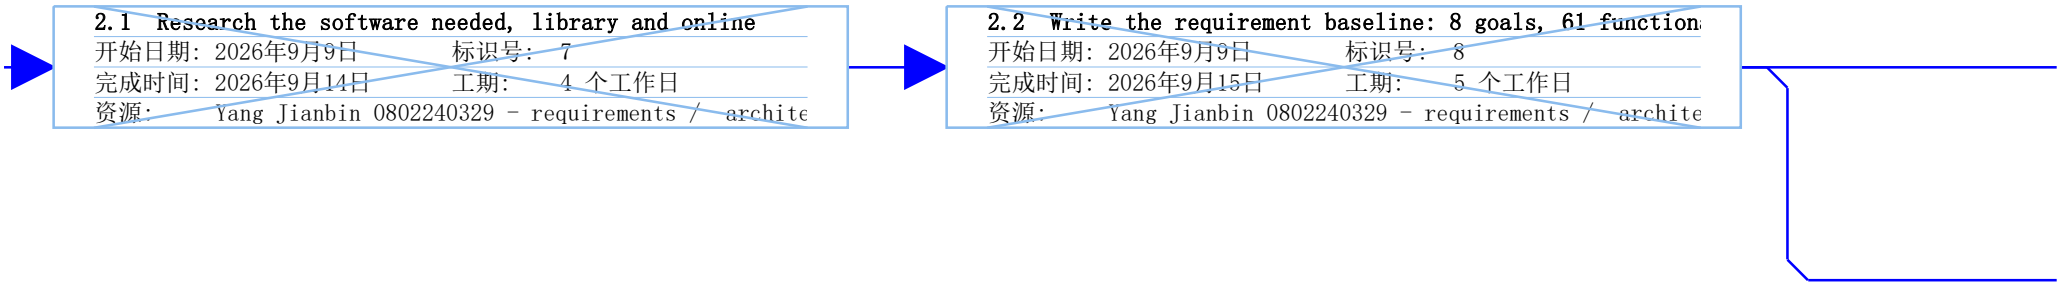
8 Integration and consolidation
开始时间：2026年9月16 标识号： 42
完成时间：2026年9月23 工期： ：6 个工作日
完成：75%

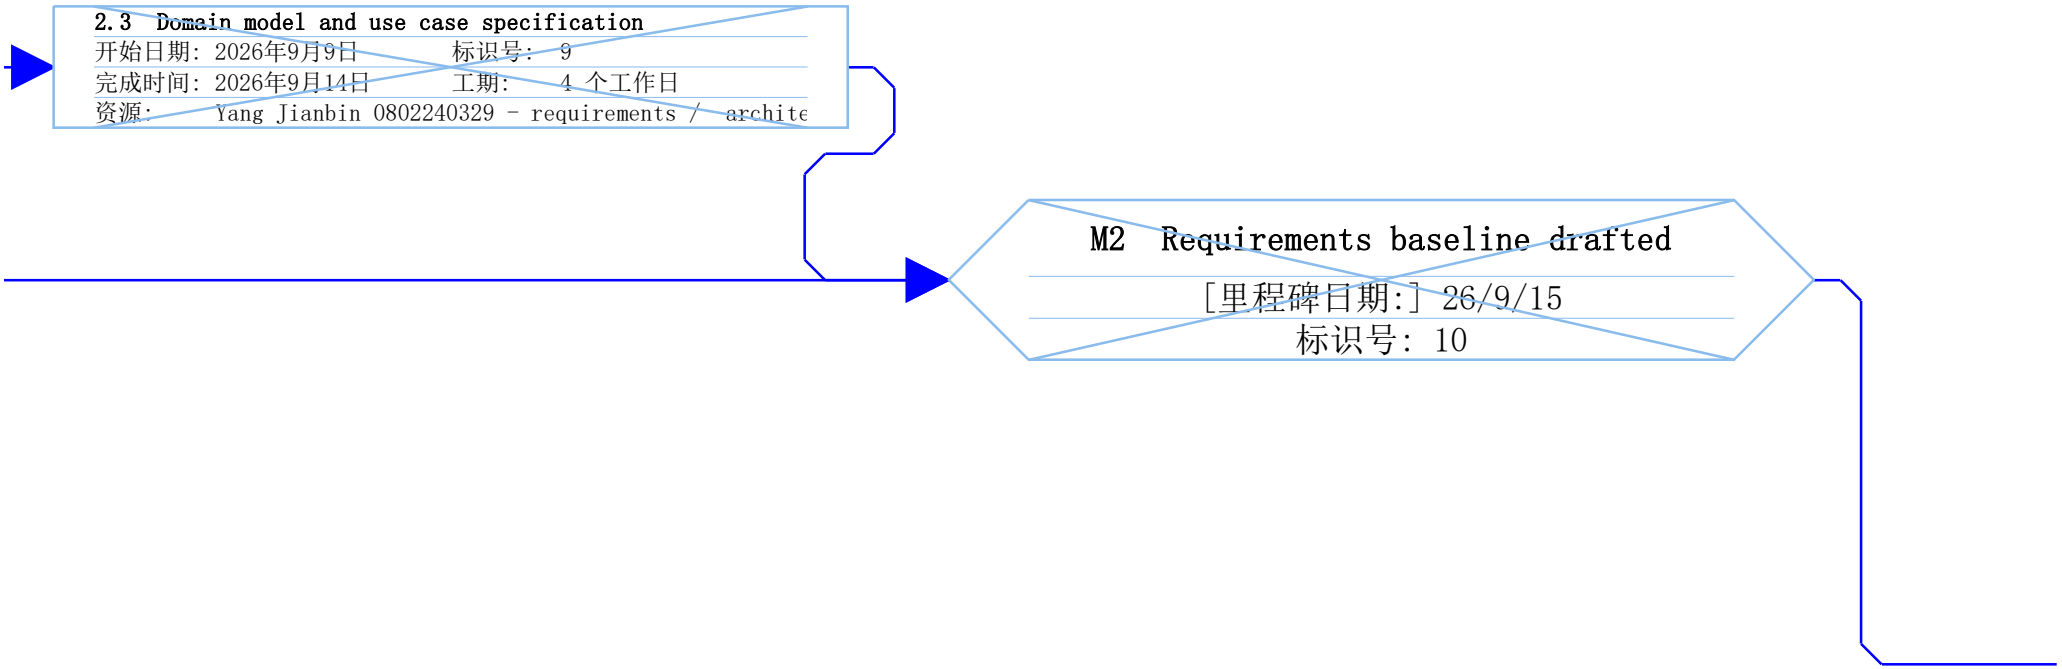
9 Verification and defect management
开始时间：2026年9月24 标识号： 46
完成时间：2026年10月2 工期： ：20 个工作日
完成：58%

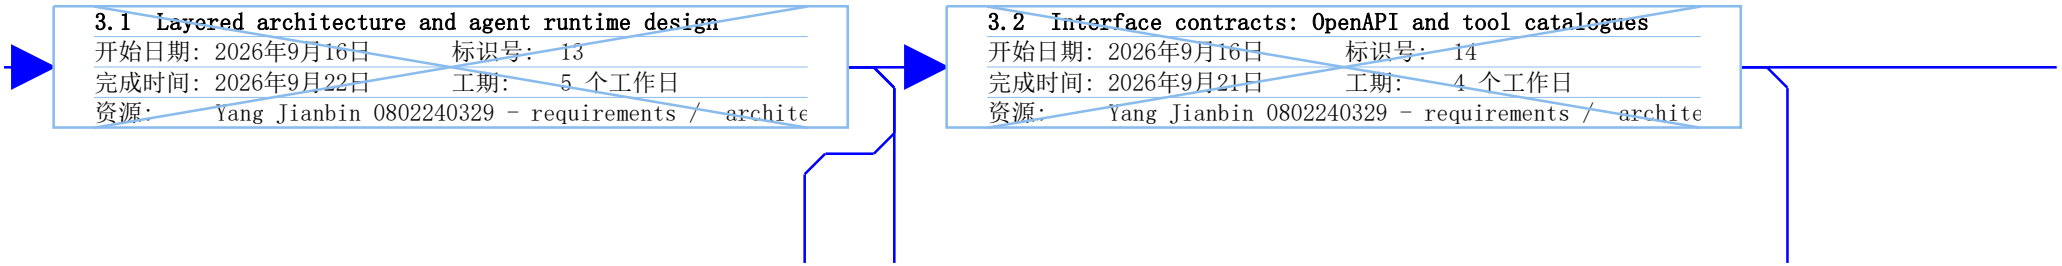
10 Coursework deliverables and reporting
开始时间：2026年9月23 标识号： 54
完成时间：2026年10月2 工期： : 23 个工作日
完成：52%

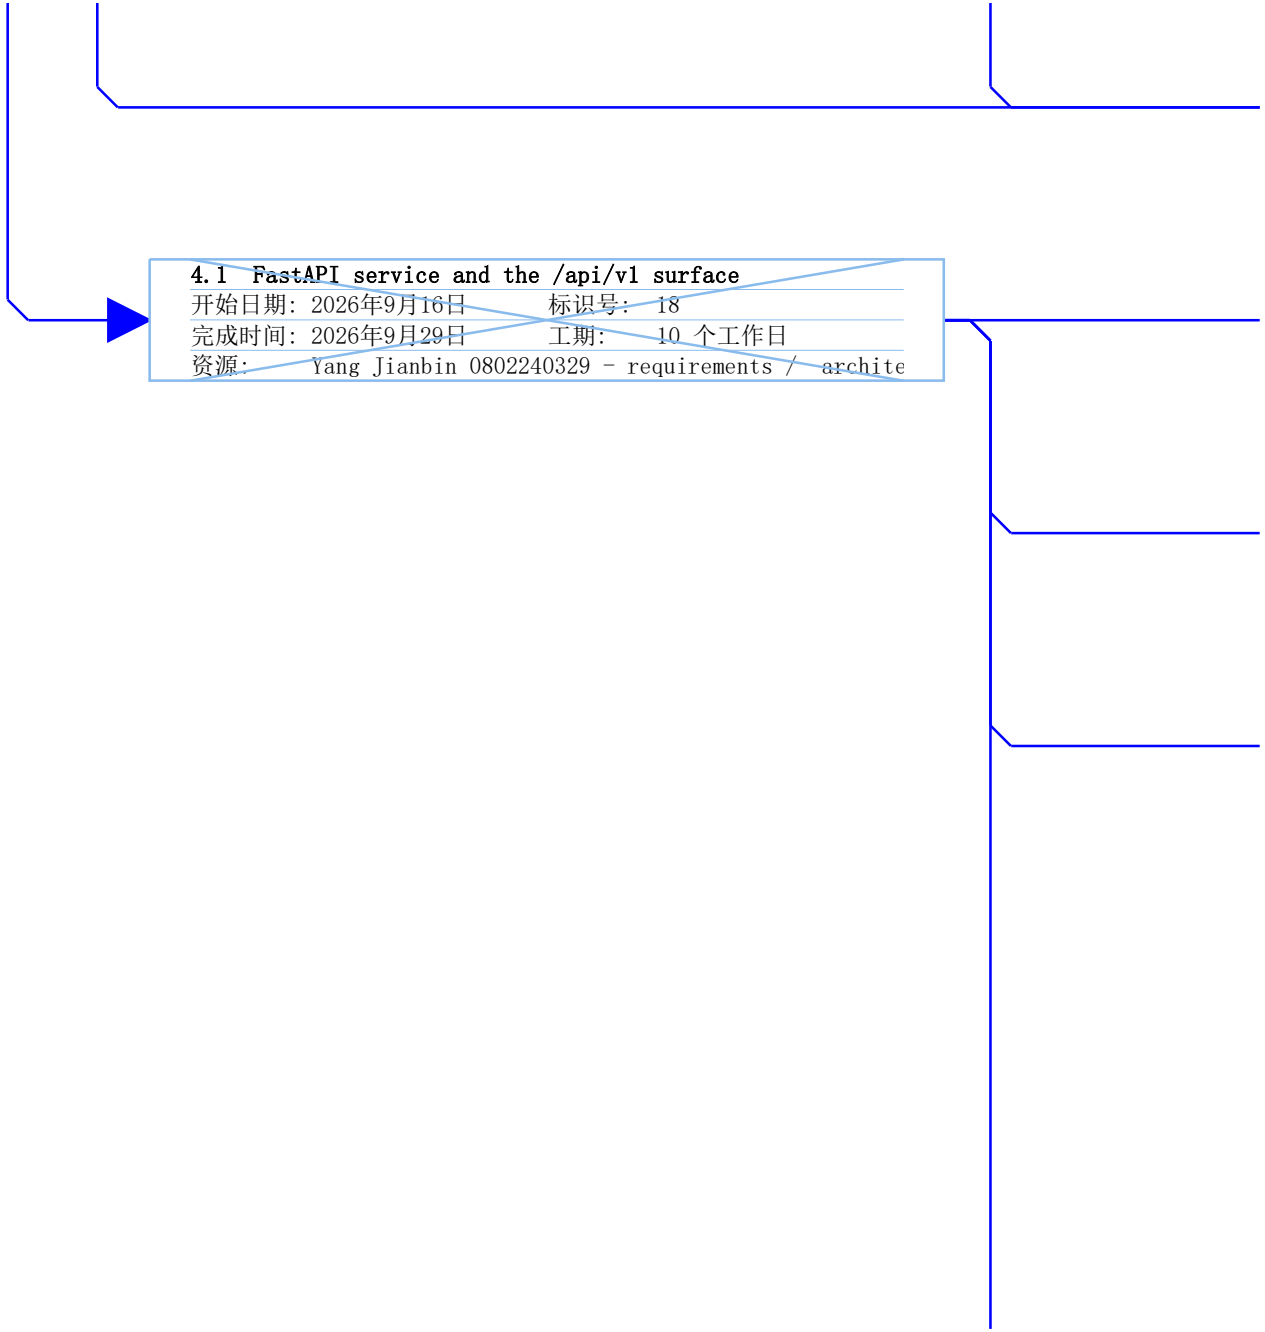
11 Final acceptance, documentation and c
开始时间：2026年10月1 标识号： 62
完成时间：2026年10月2 工期： : 5 个工作日
完成：75%


1.2 Select the project: smart city traveler system
开始日期: 2026年9月8日 标识号: 3
完成时间: 2026年9月8日 工期: 1 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite
1.3 Confirm the group of three and each member's respons
开始日期: 2026年9月8日 标识号: 4
完成时间: 2026年9月9日 工期: 2 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite
M1 Topic and scope agreed
[里程碑日期:] 26/9/8
标识号: 5

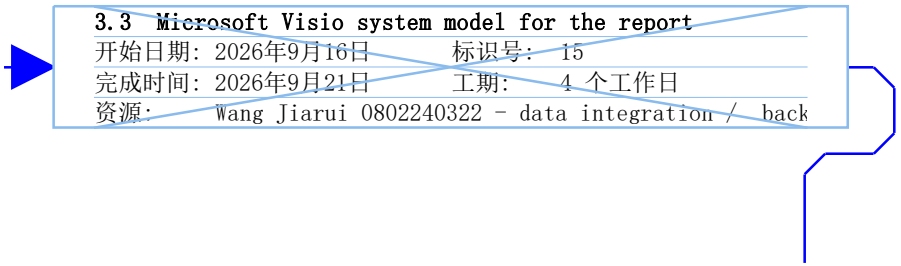

2.1 Research the software needed, library and online
开始日期: 2026年9月9日 标识号: 7
完成时间: 2026年9月14日 工期: 4 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite
2.2 Write the requirement baseline: 8 goals, 61 function
开始日期: 2026年9月9日 标识号: 8
完成时间: 2026年9月15日 工期: 5 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite

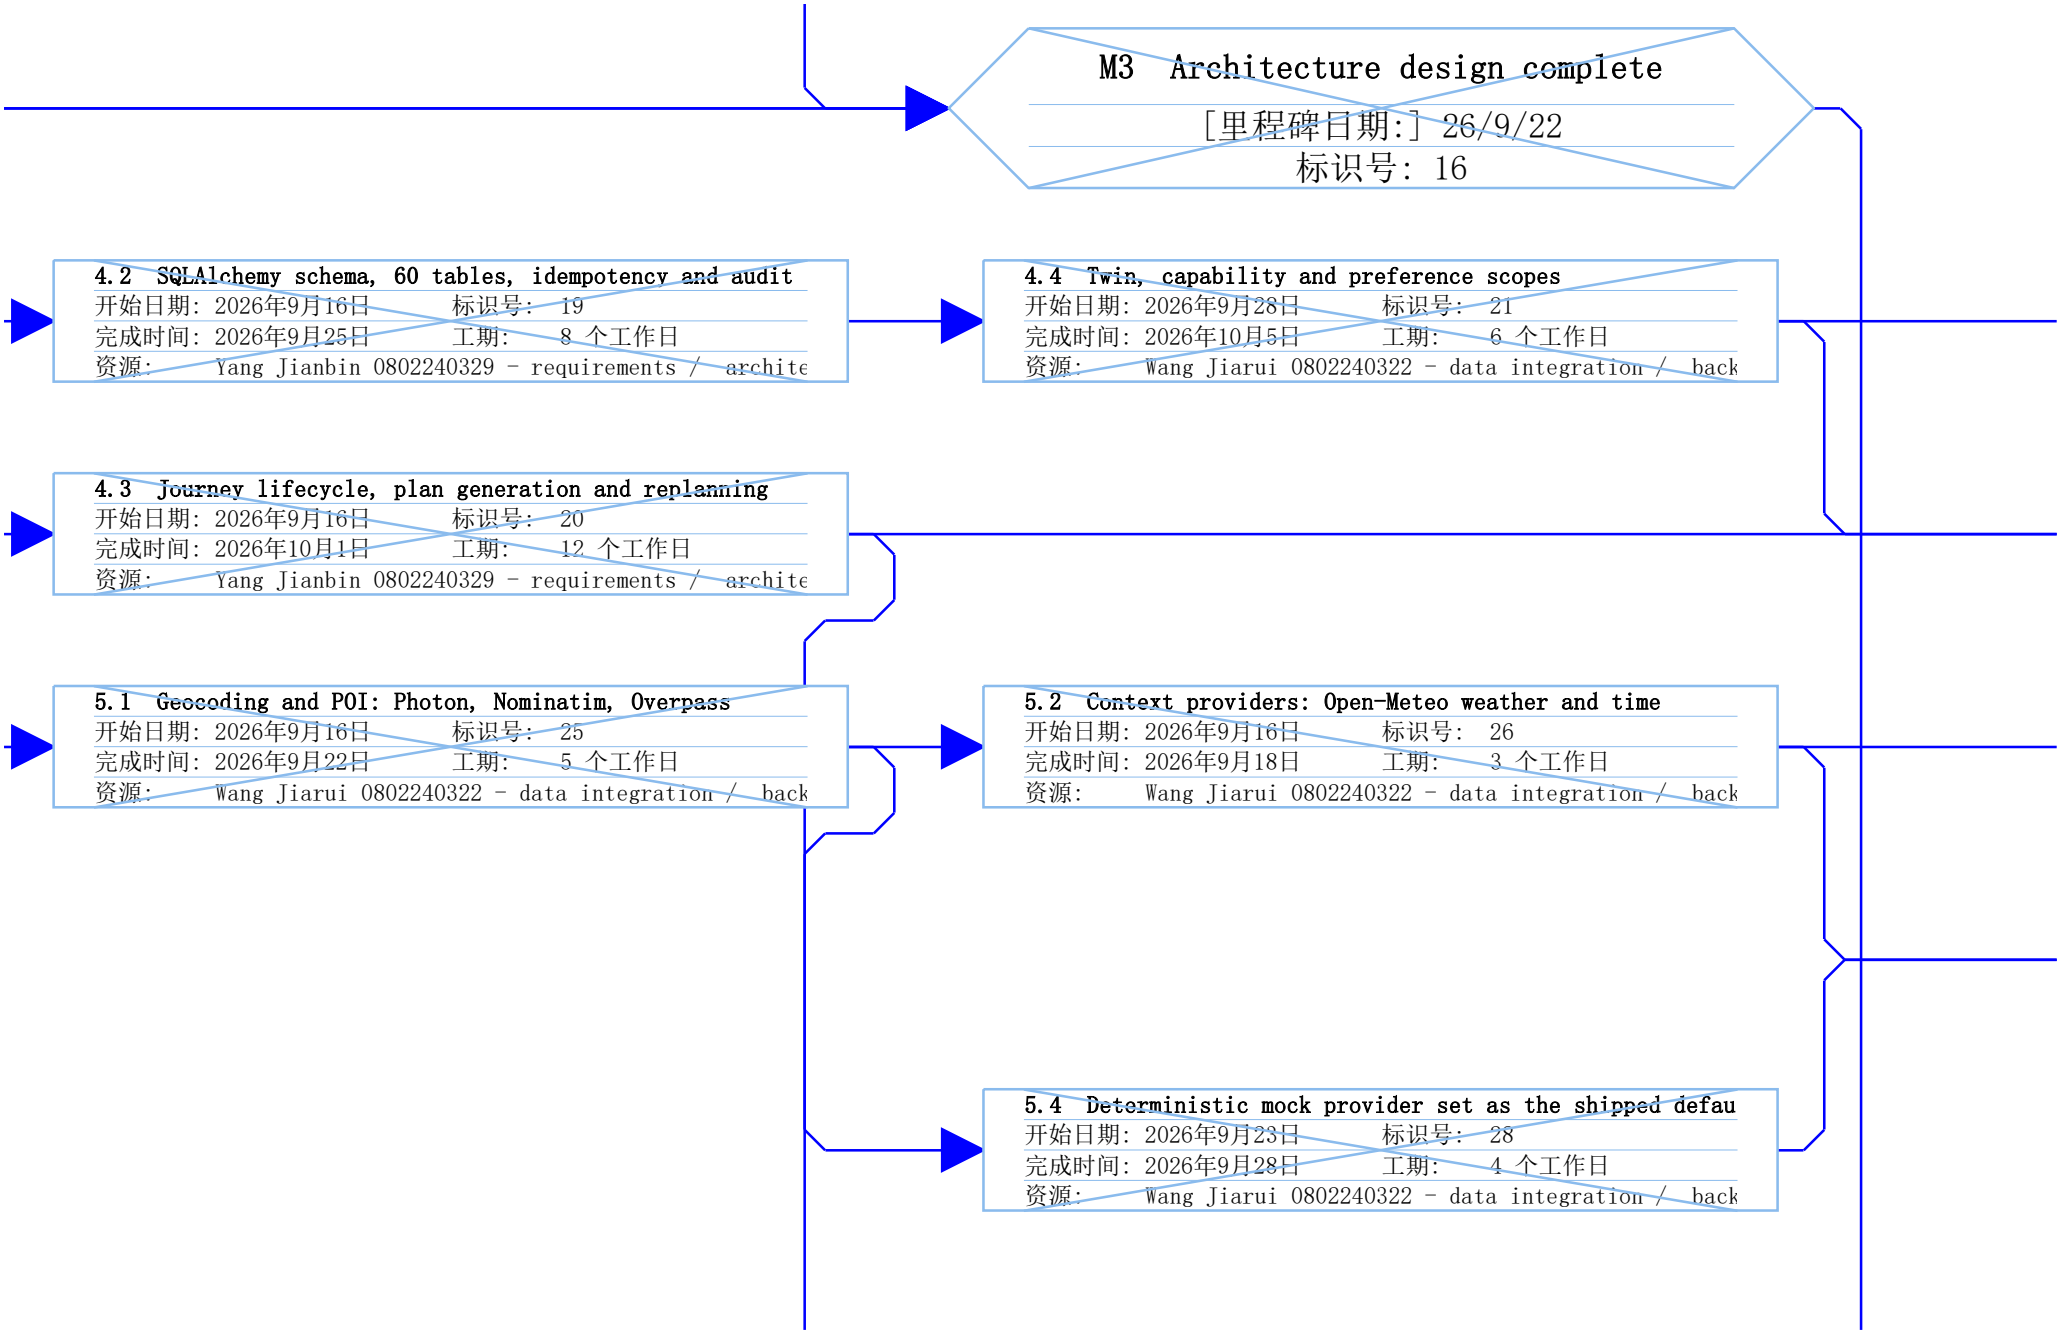

2.3 Domain model and use case specification
开始日期: 2026年9月9日
标识号: 9
完成时间: 2026年9月14日
工期: 4 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite
M2 Requirements baseline drafted
[里程碑日期:] 26/9/15
标识号: 10

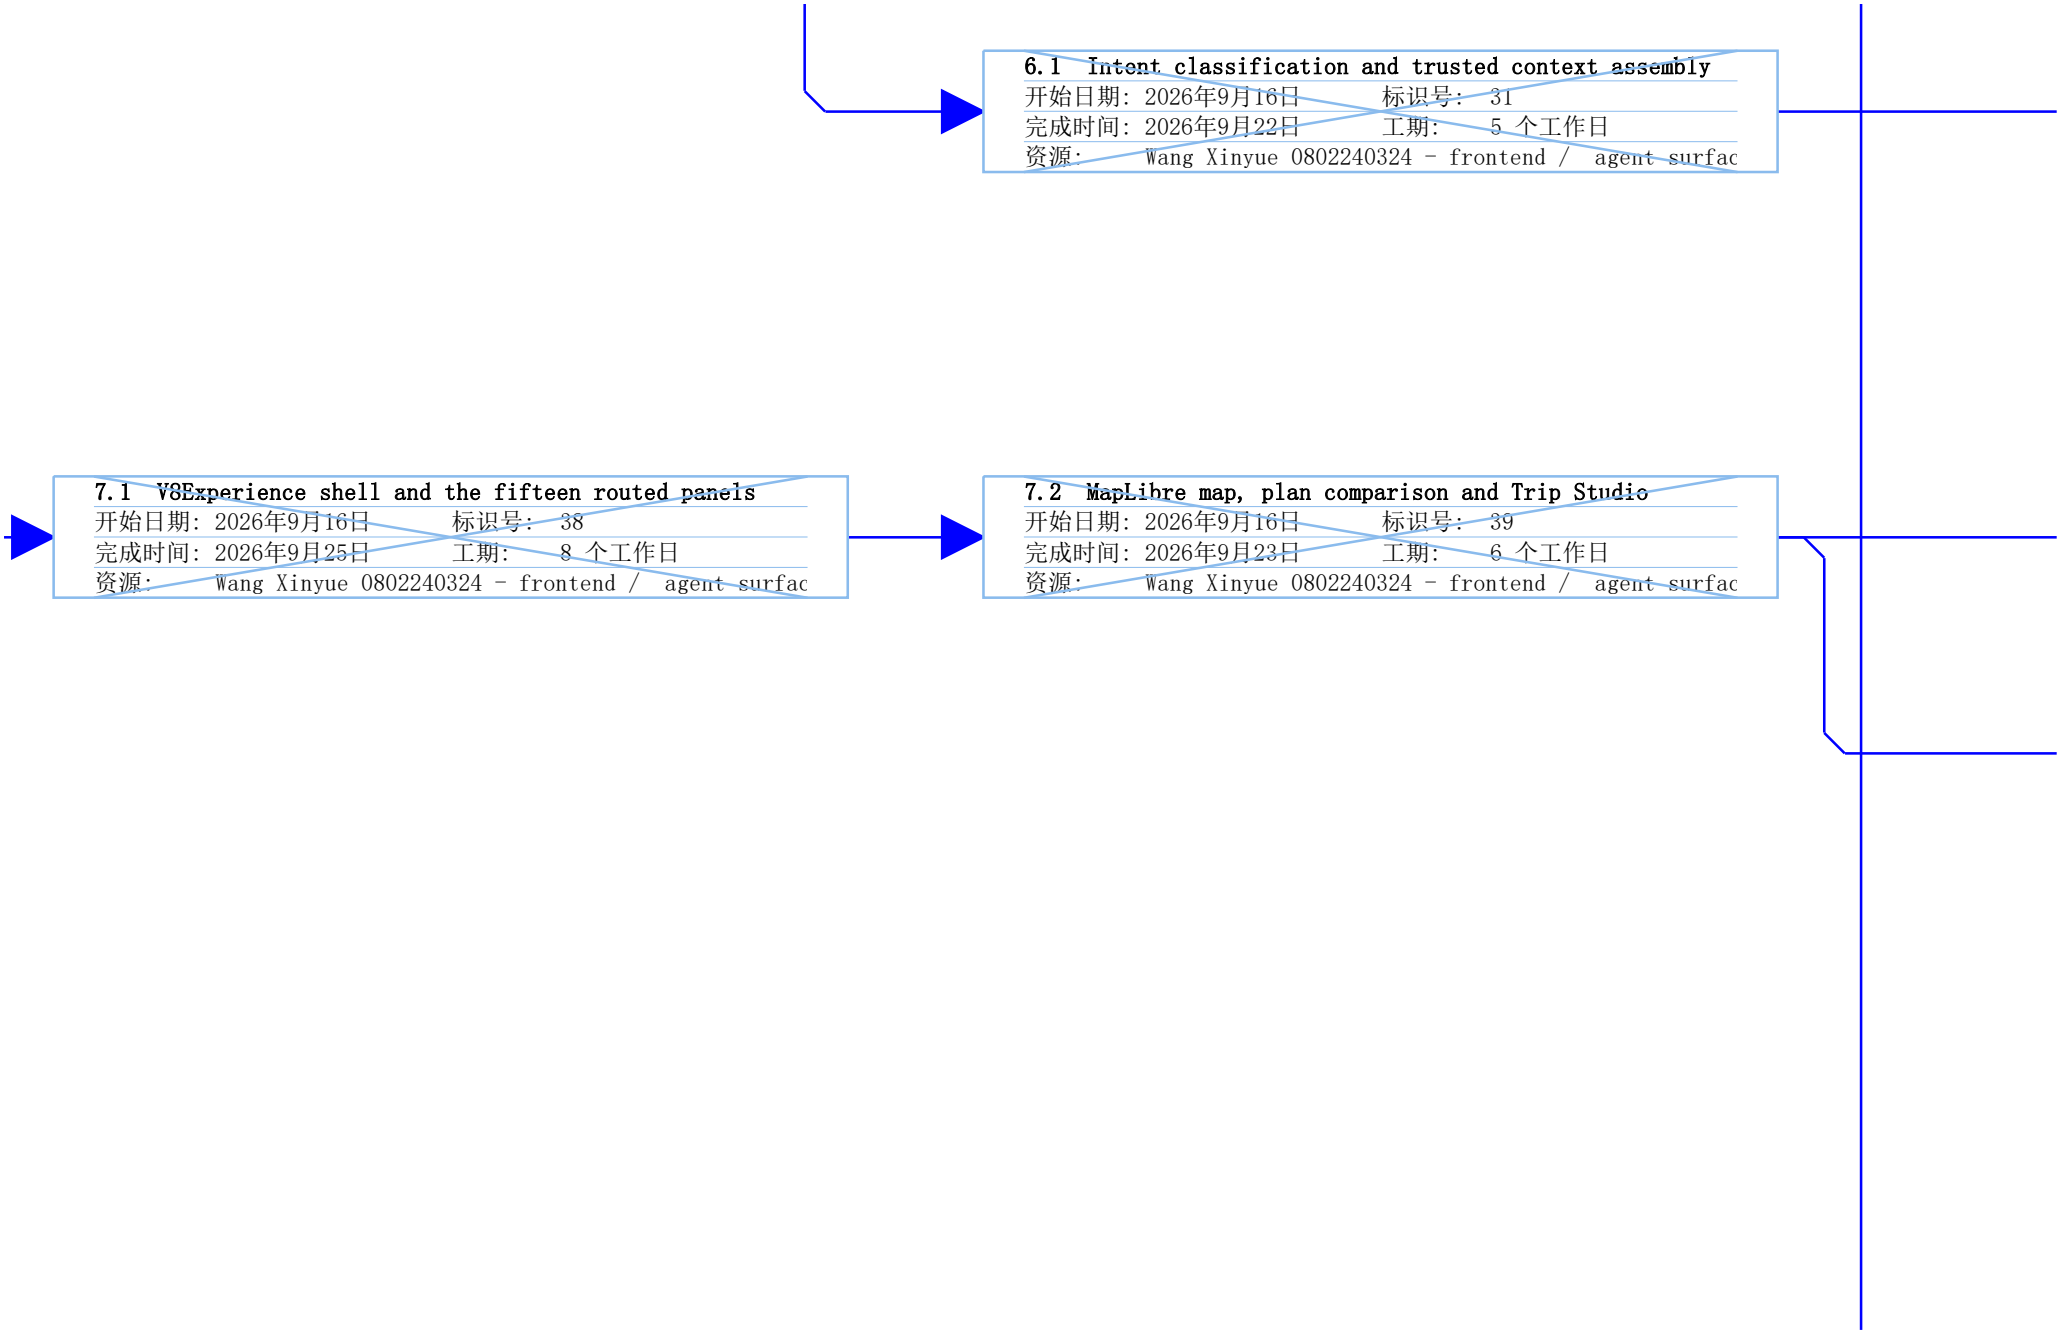

3.1 Layered architecture and agent runtime design
开始日期: 2026年9月16日 标识号: 13
完成时间: 2026年9月22日 工期: 5 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite
3.2 Interface contracts: OpenAPI and tool catalogues
开始日期: 2026年9月16日 标识号: 14
完成时间: 2026年9月21日 工期: 4 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite



4.1 FastAPI service and the /api/v1 surface
开始日期: 2026年9月16日
标识号: 18
完成时间: 2026年9月29日
工期: 10 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite




3.3 Microsoft Visio system model for the report
开始日期: 2026年9月16日 标识号: 15
完成时间: 2026年9月21日 工期: 4 个工作日
资源: Wang Jiarui 0802240322 - data integration / back


M3 Architecture design complete
[里程碑日期:] 26/9/22
标识号: 16
4.2 SQLAlchemy schema, 60 tables, idempotency and audit
开始日期: 2026年9月16日 标识号: 19
完成时间: 2026年9月25日 工期: 8 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite
4.4 Twin, capability and preference scopes
开始日期: 2026年9月28日 标识号: 21
完成时间: 2026年10月5日 工期: 6 个工作日
资源: Wang Jiarui 0802240322 - data integration / back
4.3 Journey lifecycle, plan generation and replanning
开始日期: 2026年9月16日 标识号: 20
完成时间: 2026年10月1日 工期: 12 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite
5.1 Geocoding and POI: Photon, Nominatim, Overpass
开始日期: 2026年9月16日 标识号: 25
完成时间: 2026年9月22日 工期: 5 个工作日
资源: Wang Jiarui 0802240322 - data integration / back
5.2 Context providers: Open-Meteo weather and time
开始日期: 2026年9月16日 标识号: 26
完成时间: 2026年9月18日 工期: 3 个工作日
资源: Wang Jiarui 0802240322 - data integration / back
5.4 Deterministic mock provider set as the shipped defau
开始日期: 2026年9月23日 标识号: 28
完成时间: 2026年9月28日 工期: 4 个工作日
资源: Wang Jiarui 0802240322 - data integration / back


6.1 Intent classification and trusted context assembly
开始日期: 2026年9月16日 标识号: 31
完成时间: 2026年9月22日 工期: 5 个工作日
资源: Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surfac
7.1 V3Experience shell and the fifteen routed panels
开始日期: 2026年9月16日 标识号: 38
完成时间: 2026年9月25日 工期: 8 个工作日
资源: Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surfac
7.2 MapLibre map, plan comparison and Trip Studio
开始日期: 2026年9月16日 标识号: 39
完成时间: 2026年9月23日 工期: 6 个工作日
资源: Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surfac



4.5 Commerce, guardian and autopilot

开始日期: 2026年10月6日　　标识号: 22

完成时间: 2026年10月23日　　工期: 14 个工作日

资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite

M4 Core backend running end to end

[里程碑日期:] 26/10/5

标识号: 23

5.3 Mobility: Valhalla routing behind a live URL

开始日期: 2026年9月16日　　标识号: 27

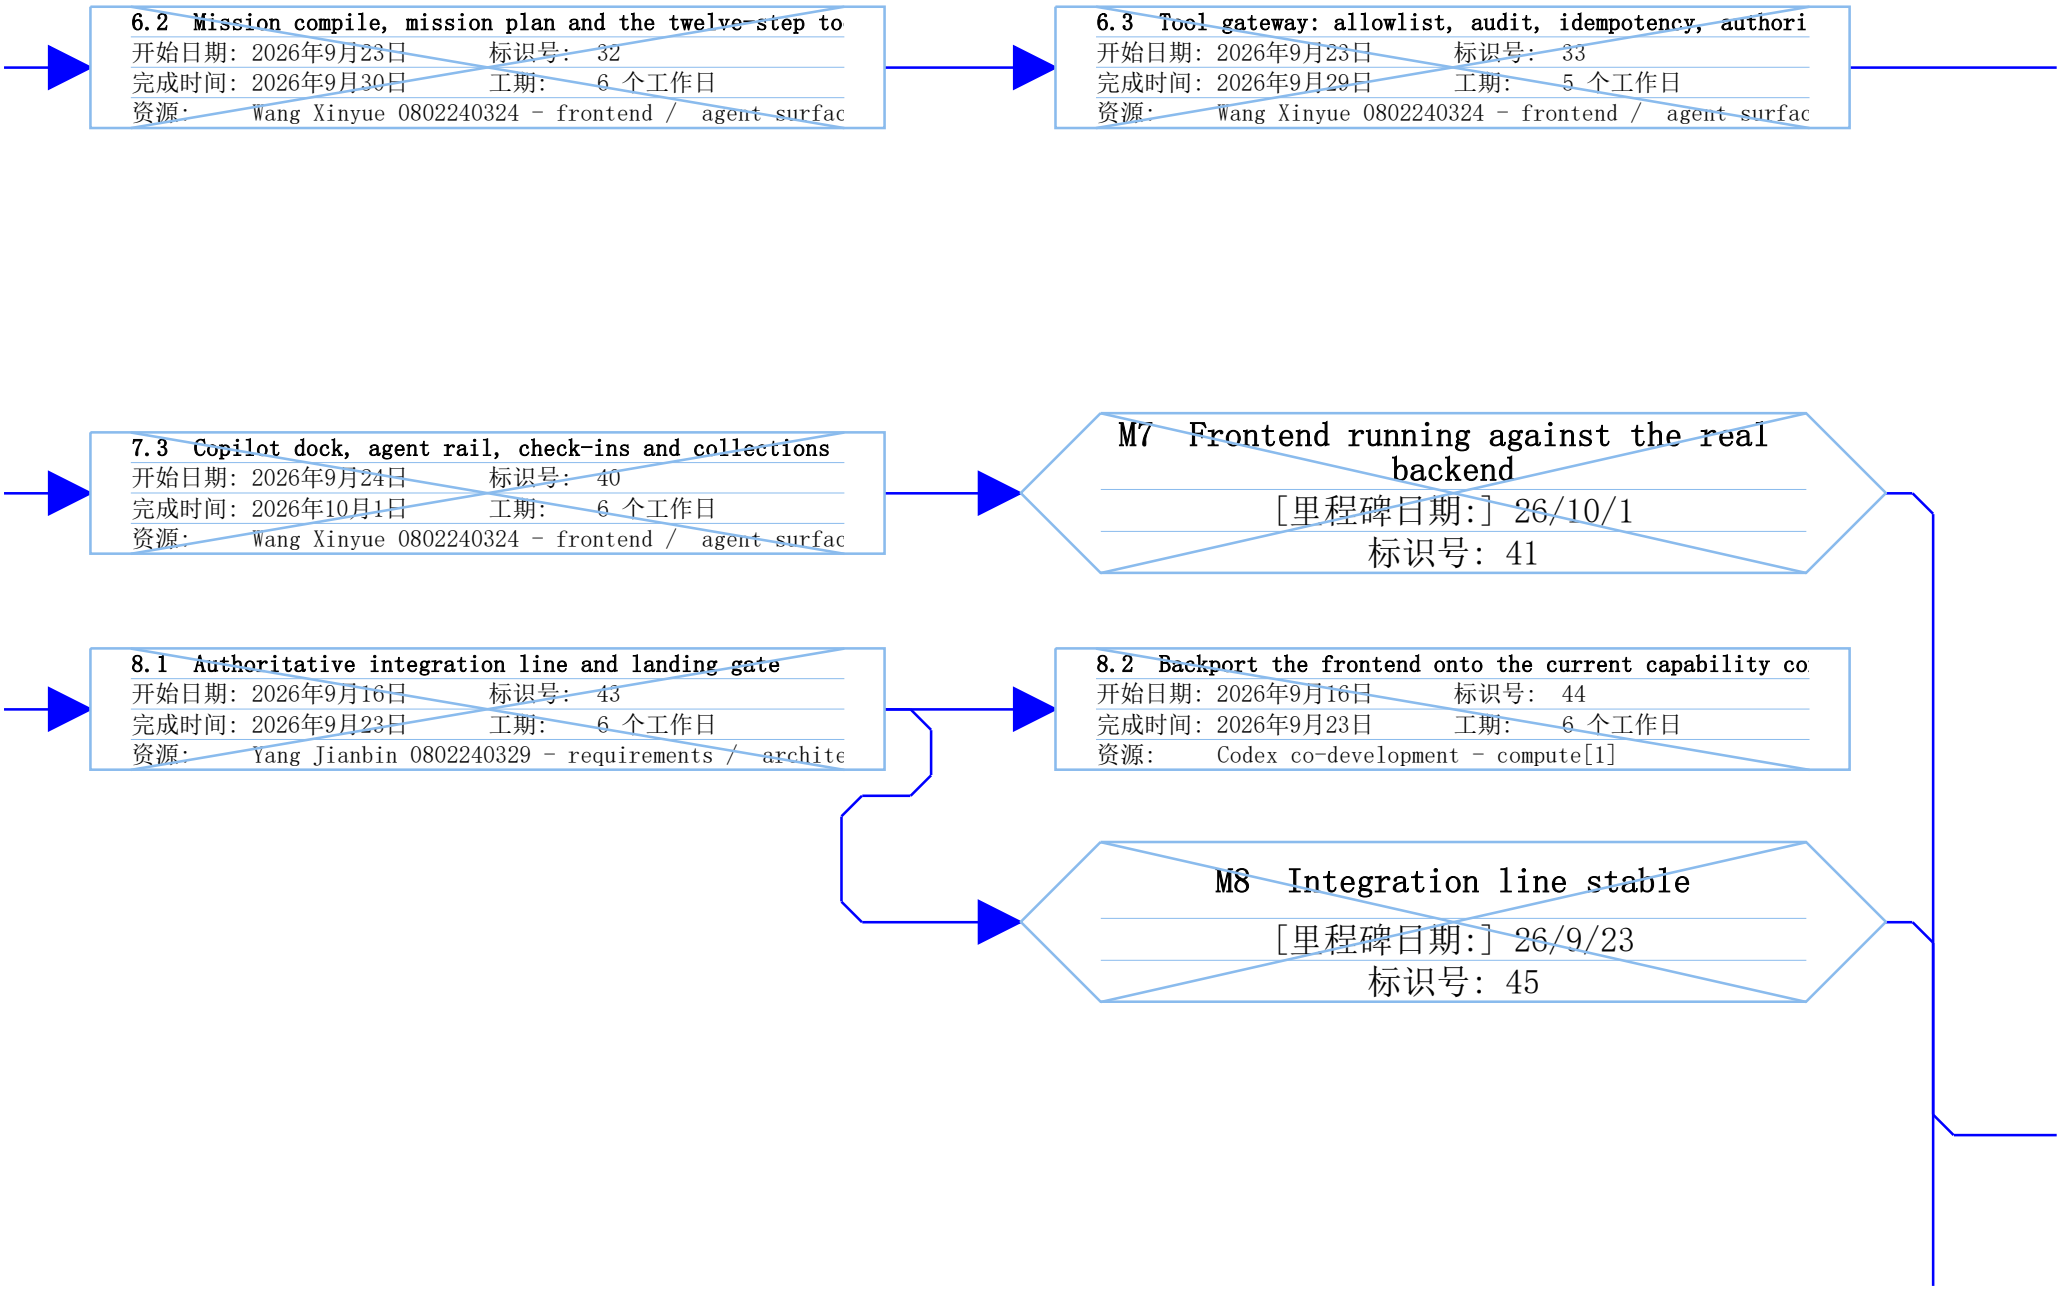
完成时间: 2026年9月21日　　工期: 4 个工作日

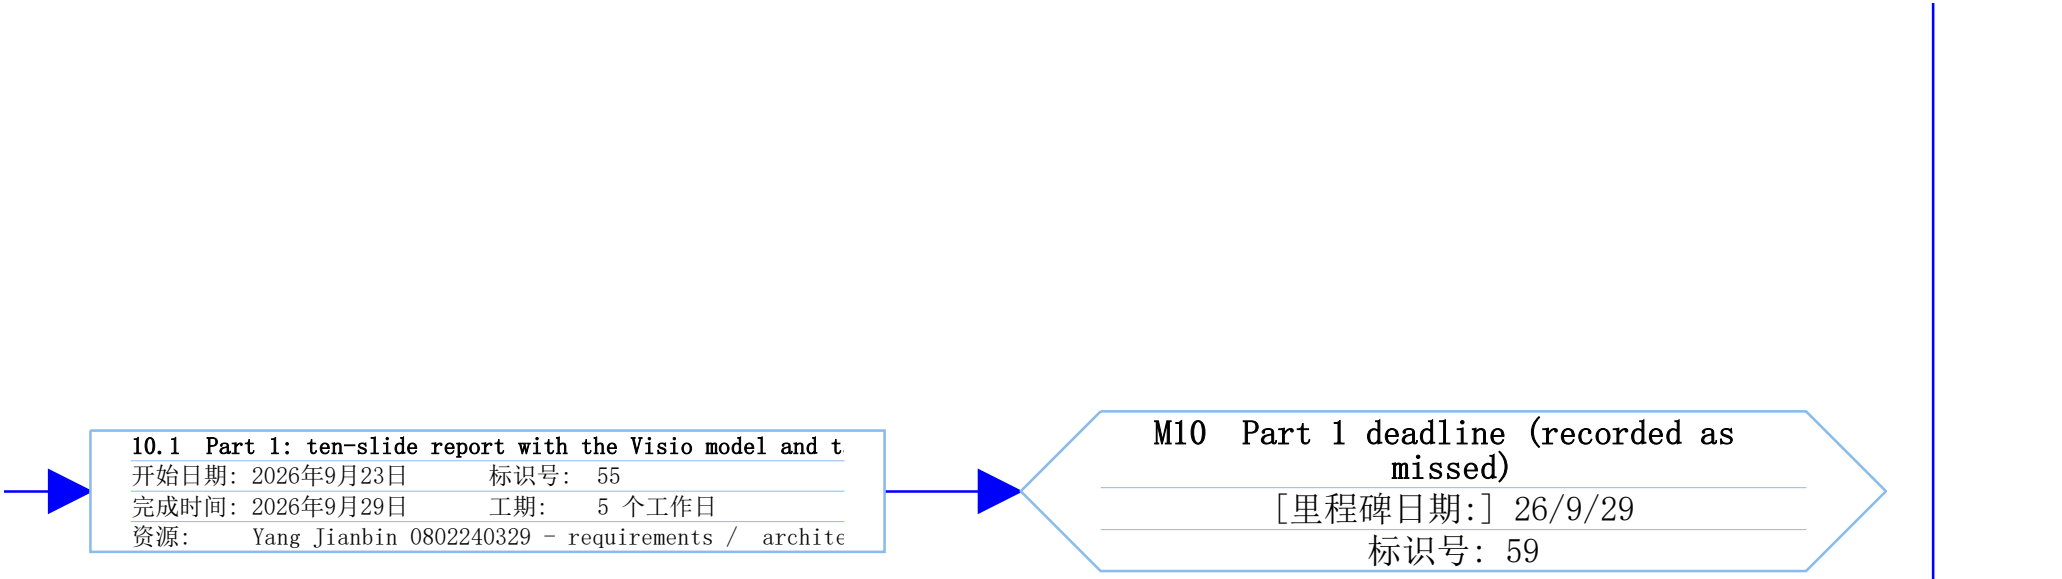
资源: Wang Jiarui 0802240322 - data integration / back

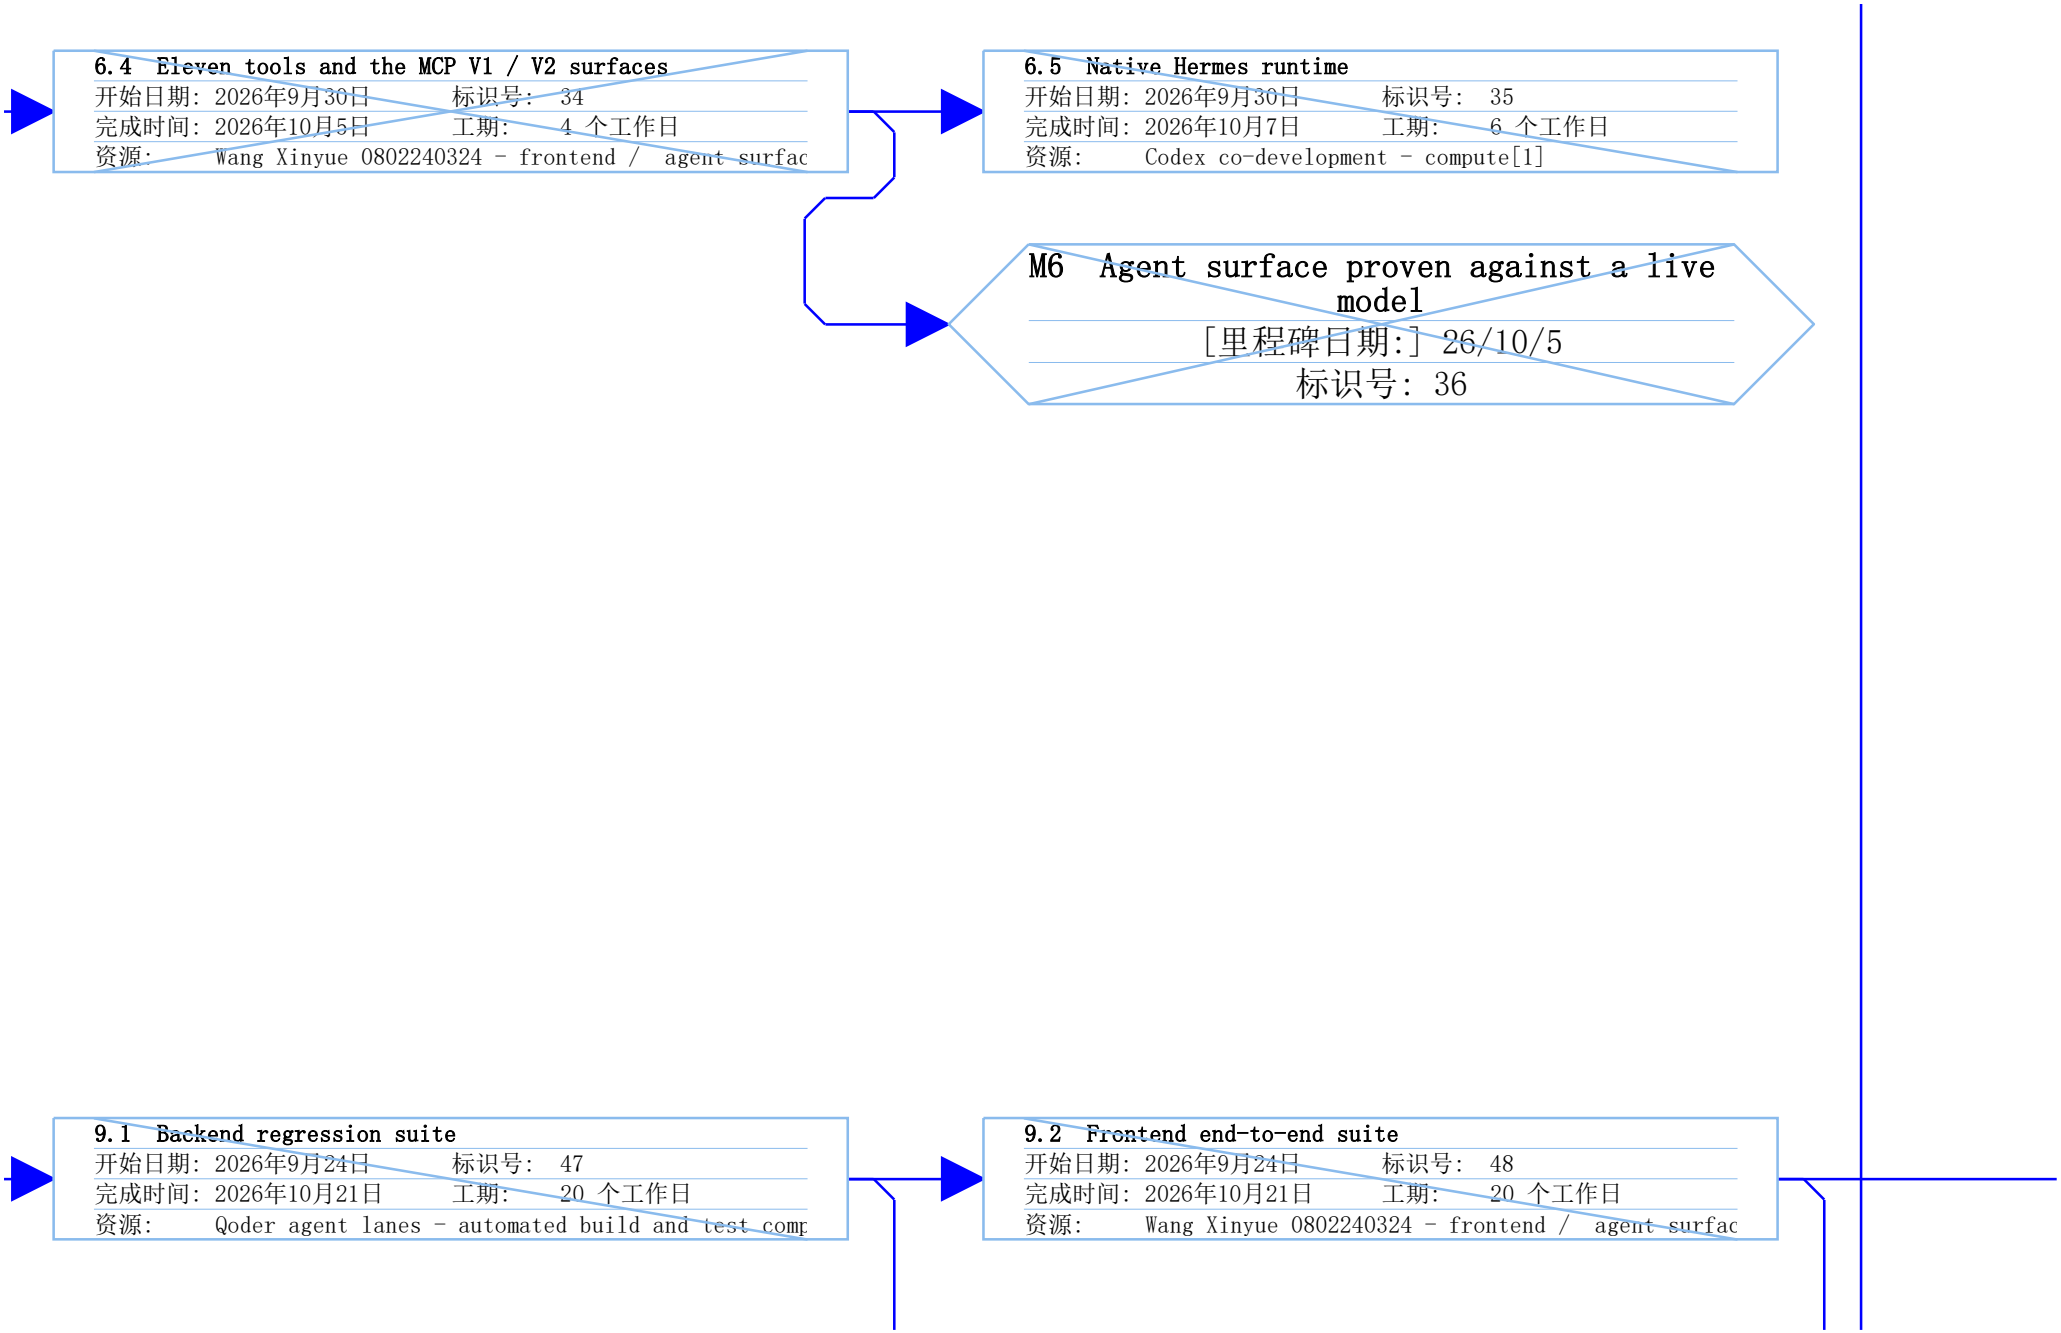
M5 Provider mesh integrated behind one interface

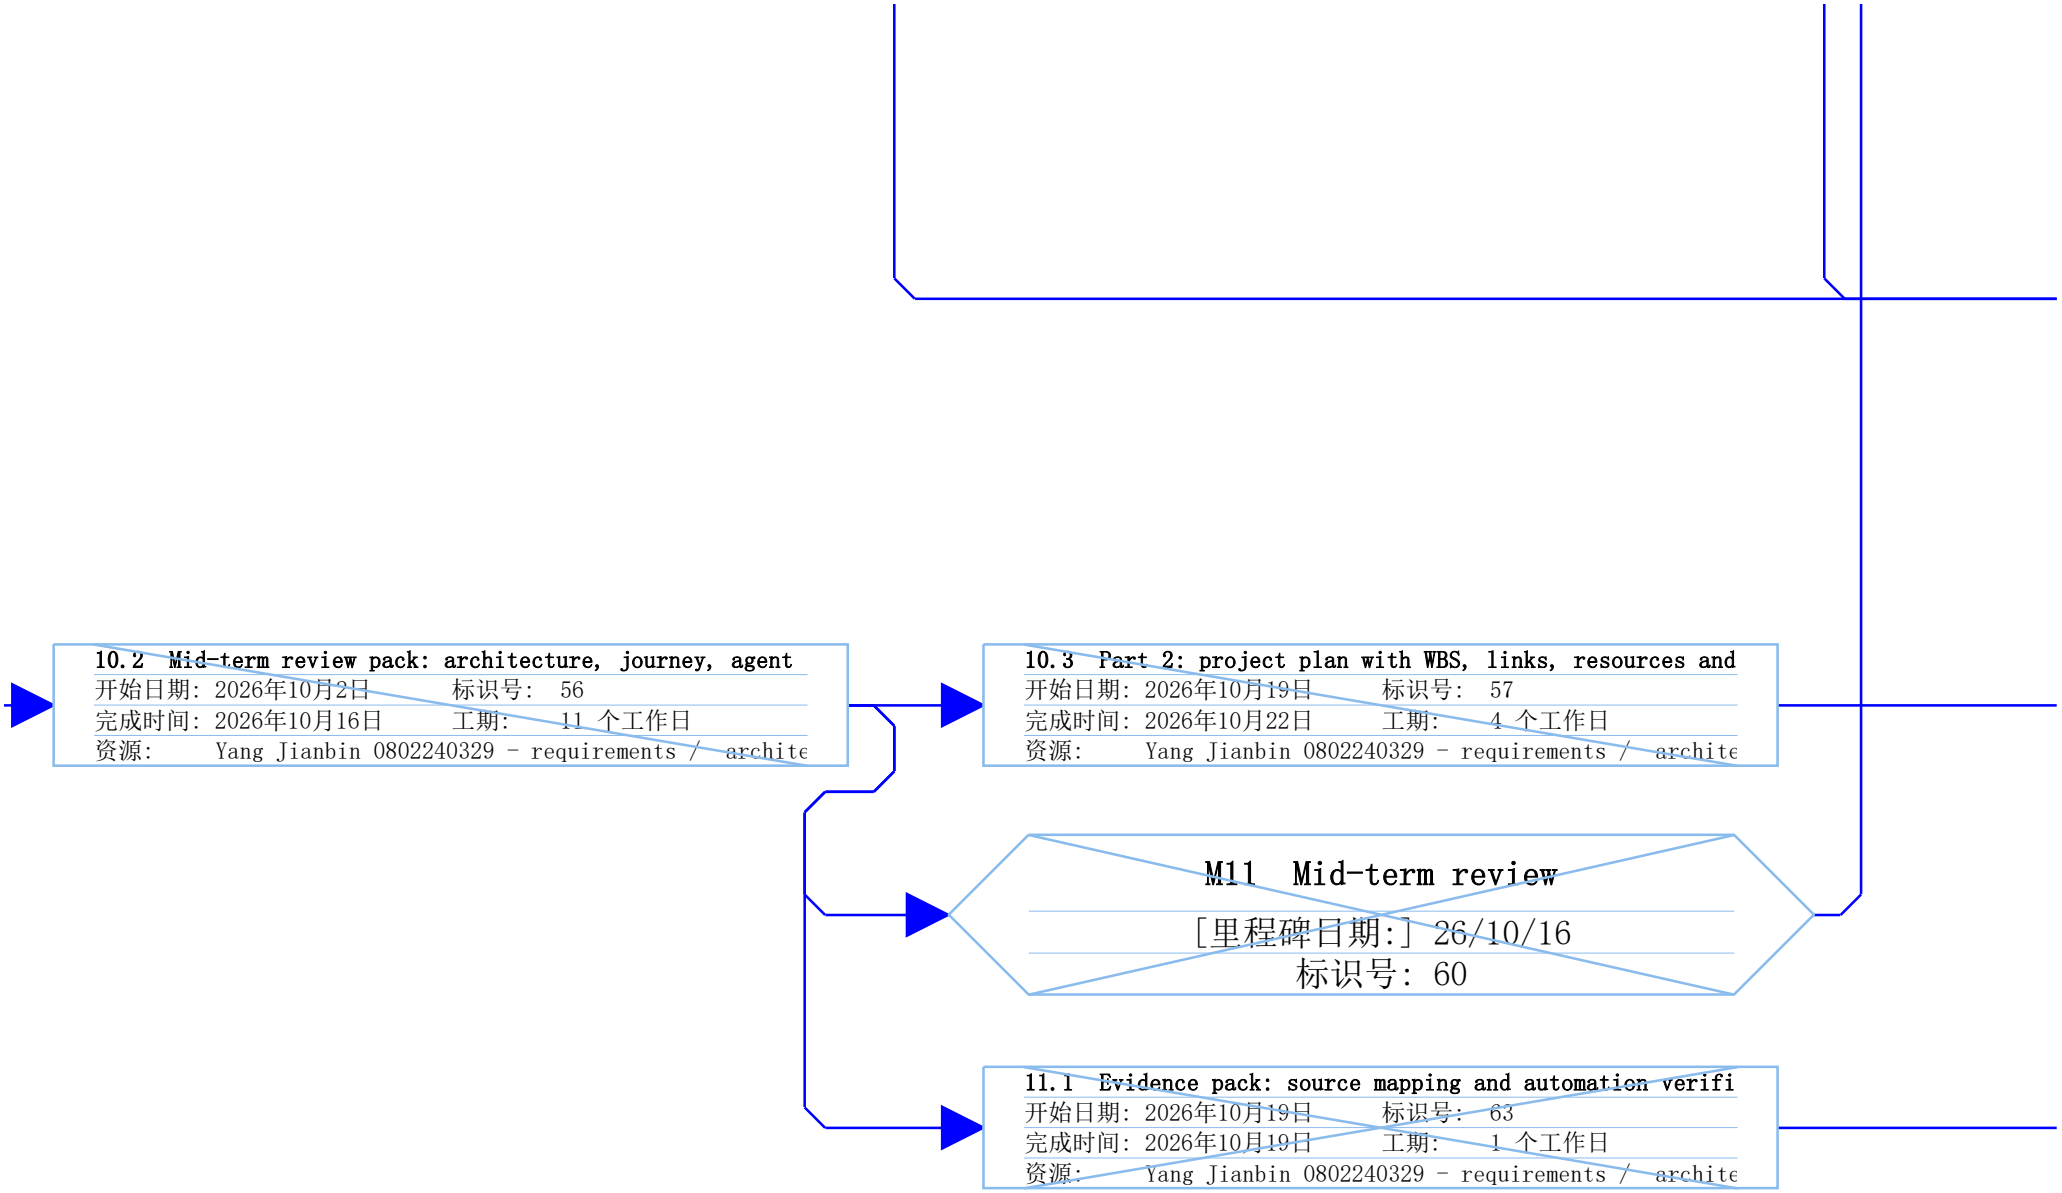
[里程碑日期:] 26/9/28

标识号: 29


6.2 Mission compile, mission plan and the twelve-step to
开始日期: 2026年9月23日 标识号: 32
完成时间: 2026年9月30日 工期: 6 个工作日
资源: Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surfac
6.3 Tool gateway: allowlist, audit, idempotency, authori
开始日期: 2026年9月23日 标识号: 33
完成时间: 2026年9月29日 工期: 5 个工作日
资源: Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surfac
7.3 Copilot dock, agent rail, check-ins and collections
开始日期: 2026年9月24日 标识号: 40
完成时间: 2026年10月1日 工期: 6 个工作日
资源: Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surfac
M7 Frontend running against the real backend
[里程碑日期:] 26/10/1
标识号: 41
8.1 Authoritative integration line and landing gate
开始日期: 2026年9月16日 标识号: 43
完成时间: 2026年9月23日 工期: 6 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite
8.2 Backport the frontend onto the current capability co
开始日期: 2026年9月16日 标识号: 44
完成时间: 2026年9月23日 工期: 6 个工作日
资源: Codex co-development - compute[1]
M8 Integration line stable
[里程碑日期:] 26/9/23
标识号: 45


10.1 Part 1: ten-slide report with the Visio model and t
开始日期: 2026年9月23日 标识号: 55
完成时间: 2026年9月29日 工期: 5 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite
M10 Part 1 deadline (recorded as missed)
[里程碑日期:] 26/9/29
标识号: 59


6.4 Eleven tools and the MCP V1 / V2 surfaces
开始日期: 2026年9月30日 标识号: 34
完成时间: 2026年10月5日 工期: 4 个工作日
资源: Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surfac
6.5 Native Hermes runtime
开始日期: 2026年9月30日 标识号: 35
完成时间: 2026年10月7日 工期: 6 个工作日
资源: Codex co-development - compute[1]
M6 Agent surface proven against a live model
[里程碑日期:] 26/10/5
标识号: 36
9.1 Backend regression suite
开始日期: 2026年9月24日 标识号: 47
完成时间: 2026年10月21日 工期: 20 个工作日
资源: Qoder agent lanes - automated build and test comp
9.2 Frontend end-to-end suite
开始日期: 2026年9月24日 标识号: 48
完成时间: 2026年10月21日 工期: 20 个工作日
资源: Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surfac



10.2 Mid-term review pack: architecture, journey, agent
开始日期: 2026年10月2日 标识号: 56
完成时间: 2026年10月16日 工期: 11 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite
10.3 Part 2: project plan with WBS, links, resources and
开始日期: 2026年10月19日 标识号: 57
完成时间: 2026年10月22日 工期: 4 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite
M11 Mid-term review
[里程碑日期:] 26/10/16
标识号: 60
11.1 Evidence pack: source mapping and automation verifi
开始日期: 2026年10月19日 标识号: 63
完成时间: 2026年10月19日 工期: 1 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite

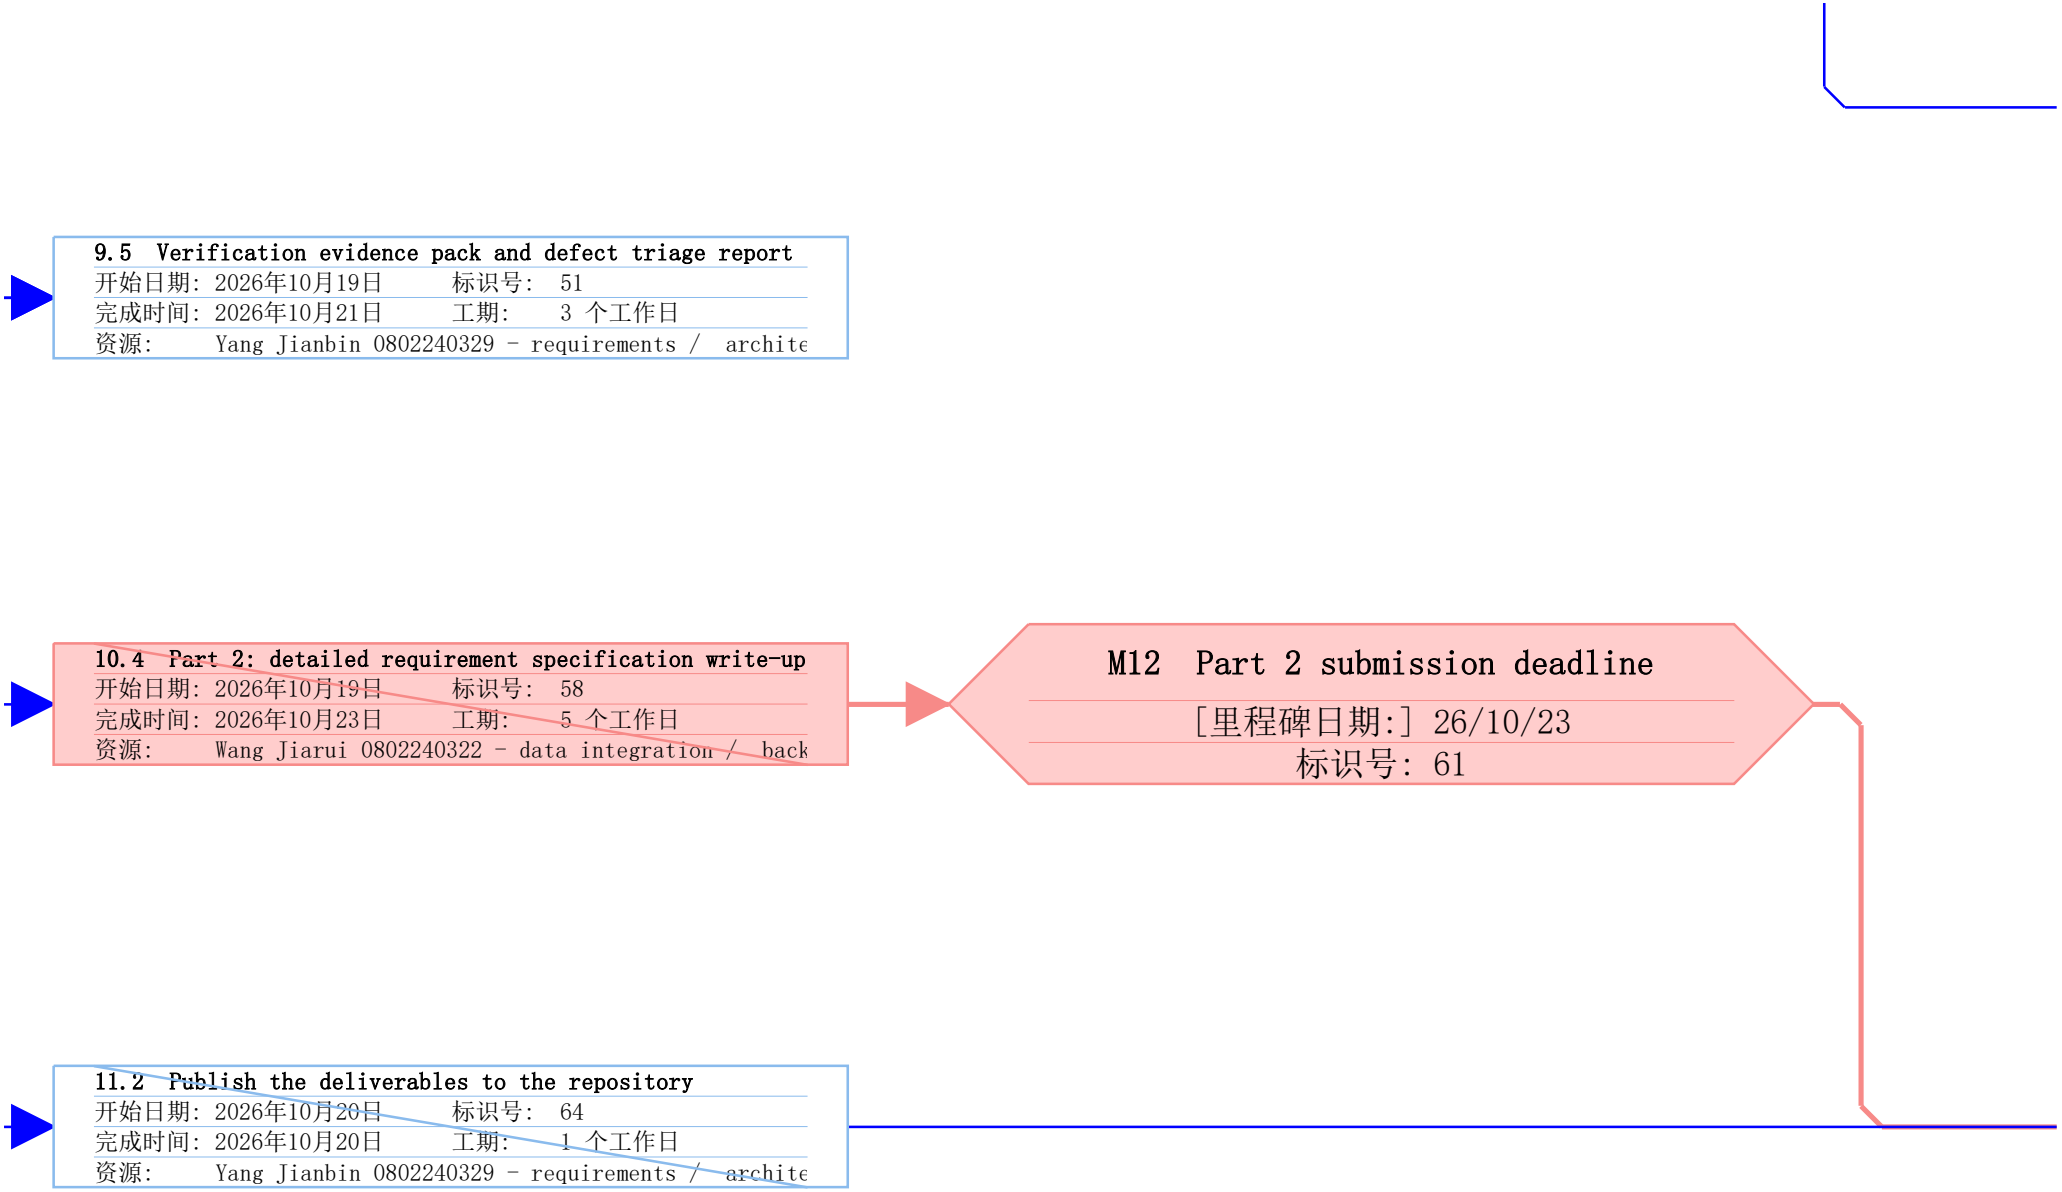
2.4 Get the requirement baseline agreed with the teacher


开始日期: 2026年10月19日　　标识号: 11

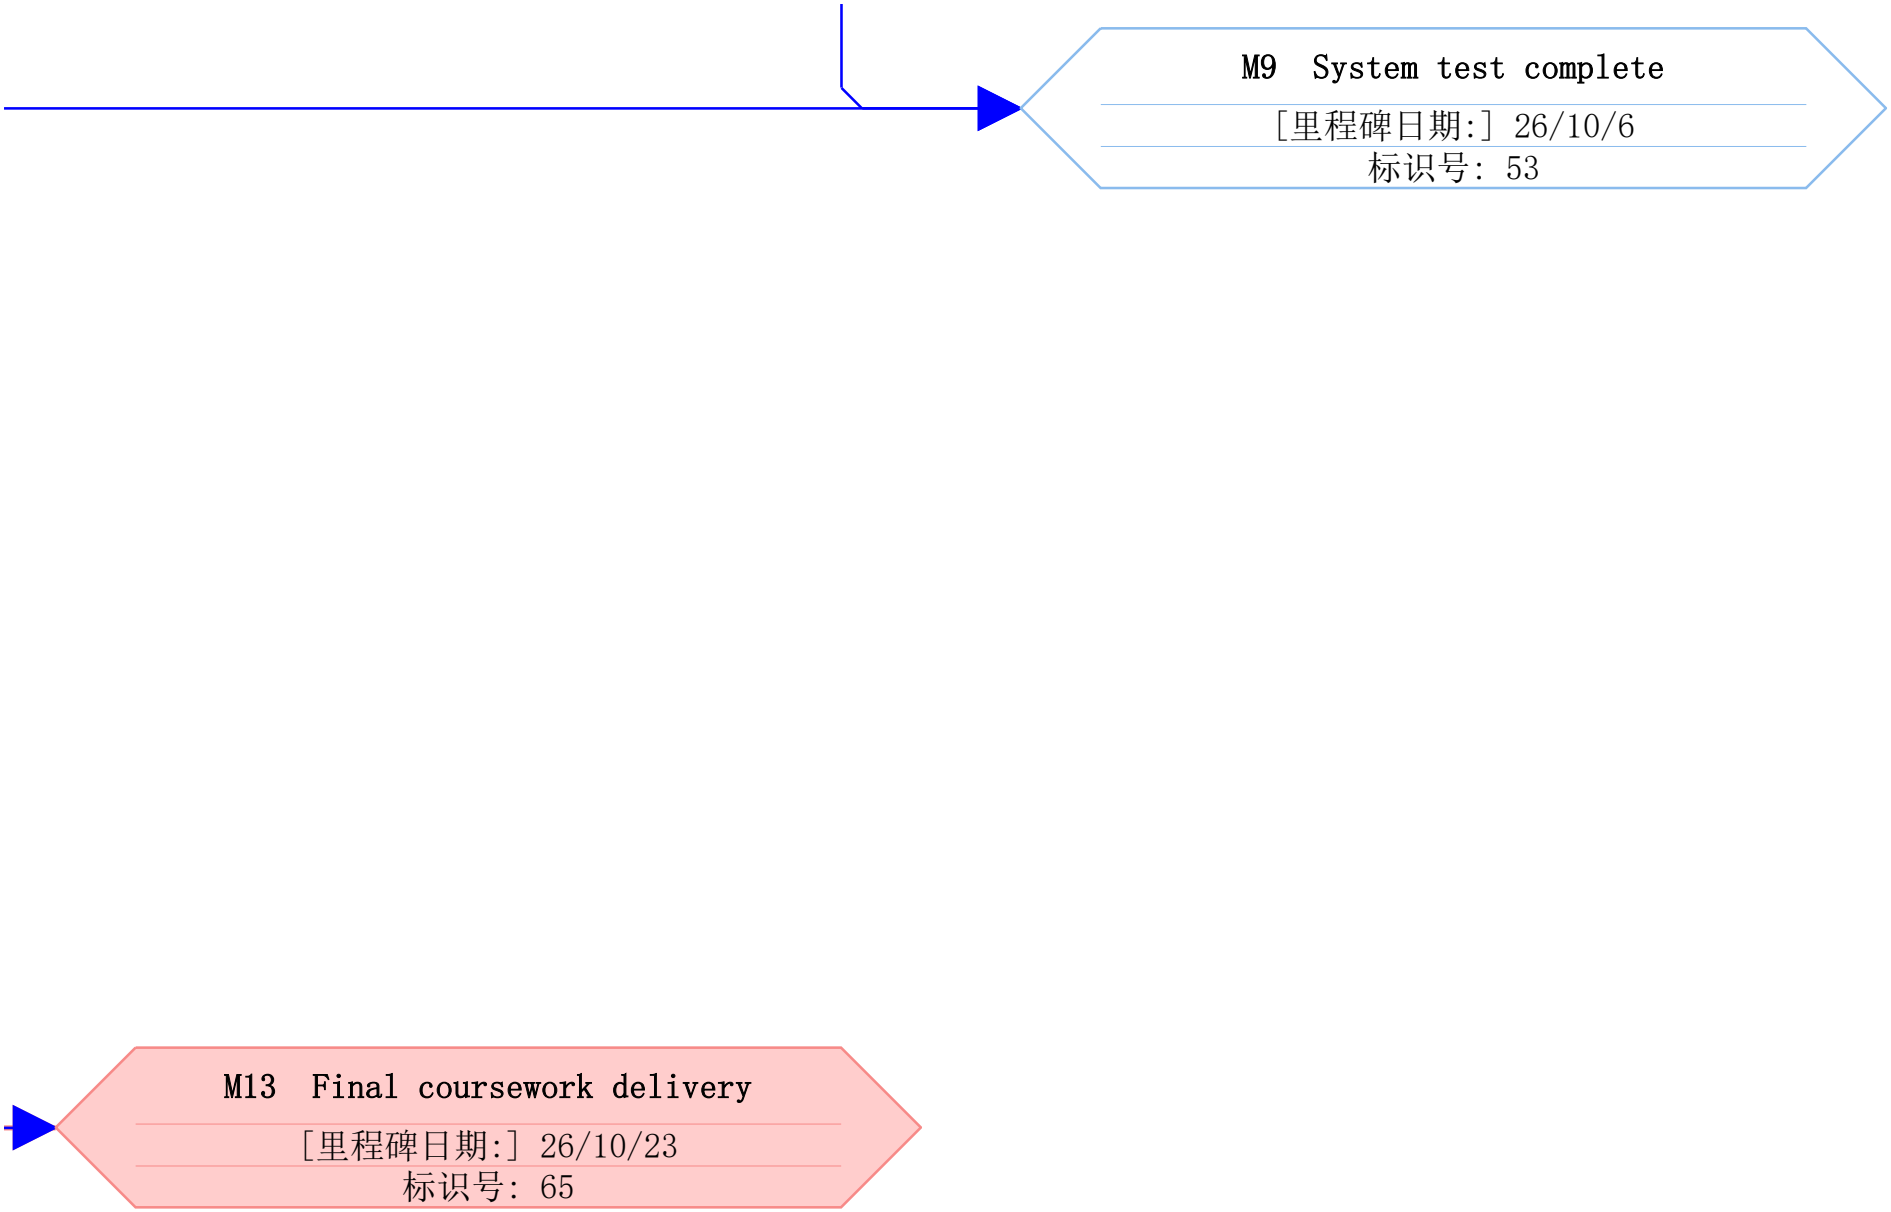
完成时间: 2026年10月21日　　工期: 3 个工作日


资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite


9.3 Close the four P0 defects from the bug report
开始日期: 2026年9月24日 标识号: 49
完成时间: 2026年9月30日 工期: 5 个工作日
资源: Wang Jiarui 0802240322 - data integration / back
9.4 Physical phone and PWA shadow trial
开始日期: 2026年10月1日 标识号: 50
完成时间: 2026年10月6日 工期: 4 个工作日
资源: Wang Xinyue 0802240324 - frontend / agent surfac


9.5 Verification evidence pack and defect triage report
开始日期: 2026年10月19日 标识号: 51
完成时间: 2026年10月21日 工期: 3 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite
10.4 Part 2: detailed requirement specification write-up
开始日期: 2026年10月19日 标识号: 58
完成时间: 2026年10月23日 工期: 5 个工作日
资源: Wang Jiarui 0802240322 - data integration / back
M12 Part 2 submission deadline
[里程碑日期:] 26/10/23
标识号: 61
11.2 Publish the deliverables to the repository
开始日期: 2026年10月20日 标识号: 64
完成时间: 2026年10月20日 工期: 1 个工作日
资源: Yang Jianbin 0802240329 - requirements / archite


9.6 Final regression re-run and defect count for the rep
开始日期: 2026年10月1日 标识号: 52
完成时间: 2026年10月2日 工期: 2 个工作日
资源: Qoder agent lanes - automated build and test comp


M9 System test complete
[里程碑日期:] 26/10/6
标识号: 53
M13 Final coursework delivery
[里程碑日期:] 26/10/23
标识号: 65



项目：CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp
日期：2026年10月22日

关键		关键标记	
非关键任务		已标记	
关键里程碑		关键外部任务	
里程碑		外部任务	
关键摘要		项目摘要	
摘要		突出显示的关键任务	
关键插入项目		突出显示的非关键任务	
插入项目			
